



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

AIR

205BG10000/655/2018

Ecatepec, Estado de México, a 10 de Agosto de 2018

DOCTOR
ISAÍAS ELIZARRARAS ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DGESU SEP.
PRESENTE

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
22 AGO 2018
EMATHÉS
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
C/ANEXOS X

1 USB


En atención a su oficio Núm. 511-3/2018.-0673 adjunto al presente el informe de avance mensual correspondiente al mes de julio del presente año de las obras apoyadas con Recursos Federales del Programa "Fondo de Aportaciones Múltiples" Nivel Superior; Ejercicio Fiscal 2017 y 2018 de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, asimismo se anexa los tres formatos relativo a las Actas Administrativas de Entrega-Recepción con sus finiquitos de las obras concluidas 2015 y 2016.

Mucho agradeceré sus comentarios al respecto, además de aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Non nova, sed secus nova"

M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

RECTOR



C.c.p

Dr. Salvador A. Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria SEP.- Presente
M. en AP. Isabel González Riestra, Jefa del Departamento de Sistemas de Información SEP.- Presente

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
Dirección General de Educación Superior
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

2018
AÑO



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FIECI

Mes reportado
Julio 2018
Fecha de corte:

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Datos de la Universidad

Nombre: Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

Entidad federativa: Estado de México

Código del proyecto: 1585U0231

Nombre: M. EN G. E. ELIAS OMAR SALCEDO MARTINEZ

Cargo: JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANIFICACION PROGRAMACION Y EVALUACION

Teléfono: 01 551 5011-403 EXT. 101, 304

Correo electrónico: uspc@uev.edu.mx

Paralelo

RESPONSABLES

Nombre: M. EN G. E. FIDEL NUÑEZ HERRERA

Cargo: SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Teléfono: 01 551 5011-400 EXT. 104, 136

Correo electrónico: aadministrador@uev.edu.mx

Clasificación y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejecutado	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a separación física, metros cuadrados y tipo de proyecto				Acciones que existen en el terreno*	Acciones por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada ¿Cuándo con qué evento?	Entrega y Recepción (Acta de Inauguración)	Acta Administrativa de Recepción	Monto de Acta Administrativa	
		Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Montes/mantenimiento				Proyecto sustantivo	espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término							
1	3ª Etapa de la Construcción de un Centro de Computo	X			\$ 6,030,000.00		\$ 6,030,000.00				1179.00		SE EJECUTAN EN CONTRATO DE OBRAS	SE EJECUTAN EN CONTRATO DE OBRAS	0%	01/08/18	30/12/18	PENDIENTE EL INICIO					
6	Mantenimiento al Edificio de la Oficina Integral de Responsabilidad Social, abaritando en pisos y plátano.		X		\$ 1,615,780.46		\$ 1,615,780.46				680.00		SE EJECUTAN EN CONTRATO DE OBRAS	SE EJECUTAN EN CONTRATO DE OBRAS	0%	01/08/18	30/12/18	PENDIENTE EL INICIO					
7	Sustitución y Colocación de 88 Luminarias dobles con baterías y Placas Solares			X	\$ 2,064,000.00		\$ 2,064,000.00				1280.00		SE EJECUTAN EN CONTRATO DE OBRAS	SE EJECUTAN EN CONTRATO DE OBRAS	0%	01/08/18	30/12/18	PENDIENTE EL INICIO					
TOTAL					\$9,679,780.46		\$9,679,780.46				1859.00												

Nombre y firma del Titular de la IES
M. EN A. JORGE ELIZABETH GARCIA MARTINEZ

1. Se certifica los datos que concuerdan a la obra o proyecto. Se pedirá apoyo esta diligencia sea necesario.
2. En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que serán reflejados en el reporte fotográfico.
3. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas y cada una de ellas.

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
M. EN G. E. FIDEL NUÑEZ HERRERA

OBRA CONCLUIDA

2018
Año

FAM
FONDO DE APORTACIONES MULTIRRILES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
OPERACIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio 2018
FECHA DE CONTEO

ESTADÍSTICA FOTOGRAFICA DEL PROGRESO DE AVANCE DE OBRAS

1 Nombre de la obra

3^o Etapa de la Construcción de un Centro de Cómputo




GRUPOS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Fecha de la fotografía
Porcentaje de avance


0%

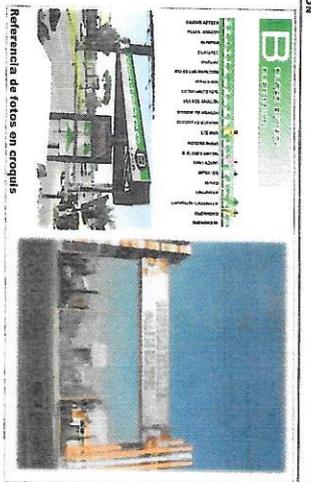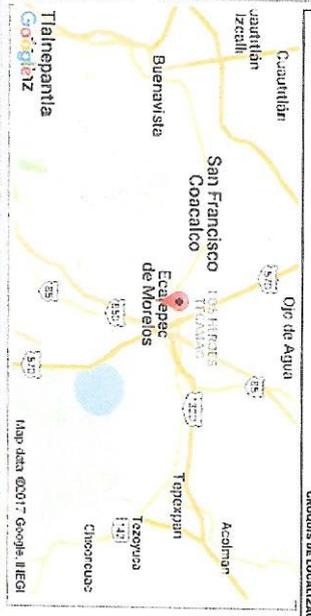

F1: Fachada principal



F2: Interior

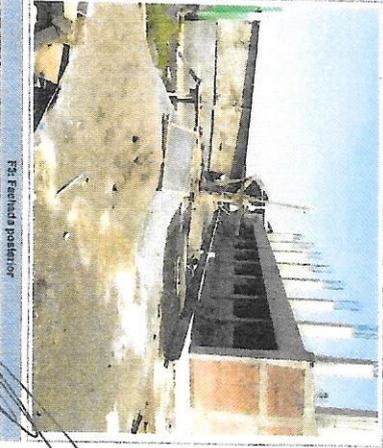

F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de sala

Nombre y firma del Titular de la Obra
M. EN A. JORGE ALVARO GARCIA MARTINEZ

Nombre y firma del Titular de la Obra y Representante de la SES
M. EN A. E. HIBEL NÚÑEZ GONZALEZ

Comentarios de los trabajos realizados:
PROGRESO POR MODO DE LA 3^a ETAPA

* En cualquier momento que se avise respecto a la fotografía de la obra, para ello se avisa una semana antes de la fecha de la fotografía, para poder recibir todas las fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y reparaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
FACULTAD DE ADMINISTRACION MULTIDISCIPLINARIA




DIRECCION GENERAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA
DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION
LIBRO DE REGISTRO DE OBRAS DE MANUTENCION Y REPARACION

Has reportado
Julio 2018
Fecha de corte:



Geografía proyectada


0%

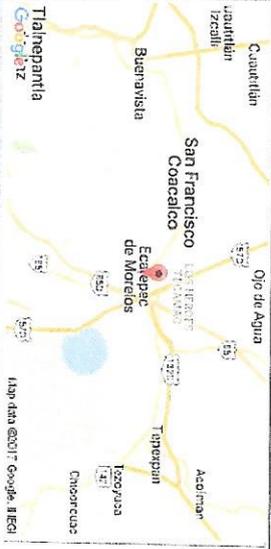

Nombre de la obra: **6** CIRCULO DE COCULAZACION
Nombre de la obra: **6** CIRCULO DE COCULAZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Comentarios de los trabajos realizados:
PENDIENTE POR LA FARM DEL CONTINIO DE OSA

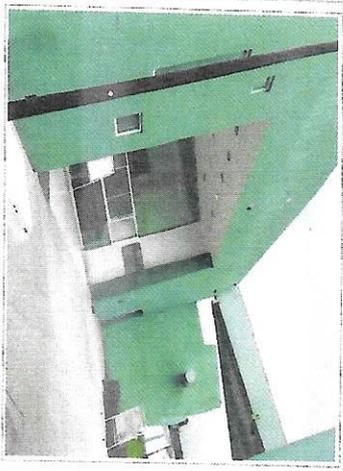

F1: Fachada principal



F2 lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

M. EN A. JOSE ELIZABETH GARCIA MARTINEZ
Nombre y firma del Titular de la IES

M. EN A. ROSA LUCIA MARTINEZ
Nombre y firma del Titular de OSA y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reportes fotograficos de todas las obras. Para esto se anexa una plantilla, se podran copiar tantas plantillas como sea necesario. Para el seguimiento, mantenimiento y adecuaciones al espacio, se recomienda que se capture la misma toma, mismo angulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

01 AL 31/06/2018

Mes que se reporta: 02/07/2018

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planación		Obras y Mar	
Nombre de la Institución: Universidad Estatal del Valle de Ecatepec		Nombre: M. EN G. E. ELIAS OMAR SALCEDO MARTINEZ		Cargo: Jefe de la Unidad de Información, Planación, Programación y Evaluación		M. EN G. E. FIDEL	
Entidad Federativa: Estado de México		Teléfono: 51011400 ext 101 o 204		Correo electrónico: uipps@uneve.edu.mx		Secretario Ac 50011400 ex s.administrativa@	
Clave Inst 911: 15MSU0923T							

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FAM		Monto	Total Recursos para la obra	No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la eclecma a utilizar	SI	N
	MONTOS PARA LA OBRA (Presos según)												
	Nombre	Monto											
Unidad Académica edificio de dos plantas para aulas 3ra Etapa de Geología	24,335.07			24,335.07	2399	100%	24,335.07	0	COMIENZO TRABAJOS DE LIMPIEZA AL ENTORNO DEL EDIFICIO PARA LA OBRA	DERIVADO A LAS PRUEBAS DE ENTREGA DE LA OBRA	CON EL PAGO DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN SE HA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO ASIGNADO		*
Segunda Etapa del Edificio para el Centro de Computo de 1 planta	4,700,000.00			4,700,000.00	1179	100%	4,699,985.43	14.57	ESTA OBRA ES DE CONTINUIDAD SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN LA SEGUNDA ETAPA, MENOS EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA OBRERA ENVIADO POR UNIVERENCO 09/08/2017	ACTUALMENTE YA SE ADJUDICÓ DERIVADO A QUE ES LA MISMA CONSTRUCTORA, POR ELO NO SE HA DETENIDO LA OBRA, RAZON POR LA CUIE REPRESENTA AVANCE FISCO	CON EL PAGO DE LAS 4 ESTIMACIONES SE HA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO ASIGNADO, SOBRE LA OBRA ESTA AL 100%.		*
Tercera Etapa del Gimnasio edificio de una planta incluye vestidores de mujeres y hombres, cancha de basquetbol, tribunas 6 bodegas, sanitarios, vestibulo	3,000,000.00			3,000,000.00	1260	70%	2,095,000.00	995,000.00	ESTA OBRA ES DE CONTINUIDAD SE ENCUENTRA EN LA TERCERA ETAPA, YA SE ELABORO EL CONTRATO DE CONSTRUCCION	SE TIENE UN AVANCE DEL 70% DE LA OBRA	PENDIENTE EL PAGO DE LA TERCERA Y ÚLTIMA ESTIMACION.		*
SUB-TOTAL	7,724,335.07		0.00	7,724,335.07	4,798.00								

Unidad Académica edificio de dos plantas para aulas 3ra Etapa de Geología	Empresa	Fuente de financiamiento	Estimaciones	N° factura	fecha de pago	N° Poliza	Cheque N°	Ejercido	x Ejercer	Menos deducciones	TOTAL
	Desarrollo Amas S A de C V	FAM 2017	1	1092	17/04/2018	51	13950	24,335.07			24,335.07

Segunda Etapa del Edificio para el Centro de Computo de 1 planta	Empresa	Fuente de financiamiento	Estimaciones	N° factura	fecha de pago	N° Poliza	Cheque N°	Ejercido	x Ejercer	Menos deducciones	TOTAL
	Desarrollo Amas S A de C V	FAM 2017	1	234	14/02/2018		13119	1,822,148.31			1,814,264.35
			2	241	08/03/2018		13231	1,816,018.19			1,808,189.53
			3		08/03/2018			866,456.00			862,721.28
			4	270	08/05/2018	24	13442	355,392.93			355,392.93
								4,699,985.43			4,699,985.43

Tercera Etapa del Gimnasio edificio de una planta incluye vestidores de mujeres y hombres, cancha de basquetbol, tribunas 6 bodegas, sanitarios, vestibulo	Empresa	Fuente de financiamiento	Estimaciones	N° factura	fecha de pago	N° Poliza	Cheque N°	Ejercido	x Ejercer	Menos deducciones	TOTAL
	Desarrollo Amas S A de C V	FAM 2017	1	607	25/05/2018	86	13503	1,005,000.00			1,000,668.10
			2	608	28/05/2018	88	13513	1,000,000.00			995,689.66
								2,005,000.00			2,005,000.00
								995,000.00			995,000.00
								6,720,320.50			6,720,320.50

M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCIA MARTINEZ
 Nombre y firma del titular de la Institución

M. EN G. E. ELIAS OMAR SALCEDO MARTINEZ
 Nombre y firma del Responsable de Planación

M. EN G. E. FIDEL NUÑI HERRERA
 Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		SEDE DE LA OBRA										MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		AULAS/ SALONES				TALLERES		LAB		CUBICULOS		
Fecha de término Programada	Fecha programada de inauguración	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FMM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FMM para equipamiento (pesos)	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	
01/03/2018	01/10/2018	MÉXICO	ECATEPEC DE MORELOS	Av. Central sin Col. Valle de Anahuac sección "A" C.P. 55210	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	1	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	0	0	1200	360.00	0.00	0.00	2.00	7.00	80.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2018	01/10/2018	MÉXICO	ECATEPEC DE MORELOS	Av. Central sin Col. Valle de Anahuac sección "A" C.P. 55211	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	1	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	0	0	200	60.00	0.00	0.00	7.00	210.00	80.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2018	01/10/2018	MÉXICO	ECATEPEC DE MORELOS	Av. Central sin Col. Valle de Anahuac sección "A" C.P. 55212	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	1	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	14	420	0	0	9	270	15	174					



UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra

IMIFE-783-CC-A2016

Siendo las 14:30 del día 10 del mes de agosto del año 2018, se reunieron el M. en G.E. Fidel Nuci Herrera, Secretario Administrativo; C. Ma Dolores Alcazar Moreno, Administradora única de la Constructora Desarrollo Almac, S.A. de C.V.; Ing. Beatriz Burgos Blas, Supervisora de Obras por el Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de México (IMIFE); así como el Ing. Peniel Octavio Peñalzoa Beristain, Contralor Interno, en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

Descripción de la Obra	Clave interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Términación de la Obra
Edificio para el Centro de Cómputo 1 edificio de una planta	IMIFE-783-CC-A2016		X	24/07/2017	20/11/2017

Obra de continuidad	SI (X)	NO ()
Etapas Número	PRIMERA	

SEDE DE LA OBRA					
Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Av. Central S/N Esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Sección "A" Ecatepec de Morelos, Estado de México C.P. 55210 Tel.: 50 01 14 00 www.uneve.edu.mx	VALLE DE ANÁHUAC	ECATEPEC DE MORELOS	15ESU0001H	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave Interna de Identificación de la obra

IMIFE-783-CC-A2016

TRABAJO EJECUTADO	
Construcción, nueva obra	X
Remodelación/Adecuación/Ampliación	

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	6
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	
Bibliotecas	
Auditorios	
C. de Cómputo	4
C. de Lenguas	
Aulas Magnas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	1
Áreas comunes	
Otros/(SANITARIOS)	4

RECURSOS FAM	
A) Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2016
Monto aportado por el FAM	\$ 2,873,997.48
Monto total ejercido del FAM	\$ 2,873,997.48
Remanente	\$0.00
Costo total de la Obra	\$ 2,873,997.48
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
Total aportado por FAM	
Costo total de la Obra	
Total metros cuadrados de la obra	
	1 179

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el M.en G.E. Fidel Nuci Herrera, Secretario Administrativo; C. Ma Dolores Alcazar Moreno, Administradora única de la Constructora Desarrollo Almac, S.A. de C.V.; Ing. Beatriz Burgos Blas, Supervisora de Obras por el Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de México (IMIFE), y el Ing. Peniel Octavio Peñaloza Berstain Contralor Interno de la UNEVE, hace(n) entrega de la misma, quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

Entrega
~~C. MA DOLORES ALCAZAR MORENO~~
 ADMINISTRADORA ÚNICA DESARROLLO ALMAC,S.A. DE C.V.

Recibe
 M. EN G.E. FIDEL NUCI HERRERA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA UNEVE

Testigo
 ING. PENIEL OCTAVIO PEÑALOZA BERSTAIN
 CONTRALOR INTERNO DE LA UNEVE



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

Oficio No. 205V13000-8919/2017
Asunto: Invitación Entrega Oficial

Toluca, Estado de México, a 29 de Noviembre de 2017

RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
COL. VALLE DE ANÁHUAC
ECATEPEC, MÉXICO.
~~PRESENTE.~~


Por este conducto me permito informar a Usted, que el día 07 de Diciembre de 2017 a las 11:30 horas, se llevará a cabo el acto de Entrega-Recepción de los trabajos de PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CÓMPUTO (TRABAJOS PRELIMINARES Y DE CIMENTACIÓN), EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, UBICADA EN COL. VALLE DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE ECATEPEC, MÉXICO, relativos al contrato No.IMIFE-783-CC-A2017, realizados por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

Lo anterior para que este acto se efectúe en la fecha y hora citados, en las instalaciones del plantel a su digno cargo.

sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


ING. MAURICIO NAIME NEMER
DIRECTOR TÉCNICO


12/2017



c.c.p. DESARROLLO ALMAC, S.A. DE C.V.
Minutario,
MNN/JMG/pgs.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA

BLVD. ISIDRO FABELANTE NO. 900, COL. 3 CAMINOS, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50020 TEL. 236-05-90 EXT. 2102




ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

En la localidad de COL. VALLE DE ANÁHUAC, del Municipio de ECATEPEC, Estado de México, siendo las 11:30 horas del día 07 de Diciembre de 2017, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, la Empresa Contratista, la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Finanzas y de la Comunidad que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado:

"UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC"

PROGRAMA: CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ENCARGO 2016
 PARTIDA: OBRA NUEVA
 CODIGO: CC16066

UNIDAD EJECUTORA:		DATOS GENERALES				
DEPENDENCIA QUE OPERARÁ LA OBRA:		INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		LA DIRECCION DEL PLANTEL.				
		DESARROLLO ALMAC, S.A. DE C.V.		R.F.C.	DAL-130410-D41	
NUMERO DE CONTRATO:		PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS				
		CONTRACTUAL			REAL	
ORIGINAL	IMIFE-783-CC-A2017	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO	
CONVENIO ADICIONAL		24/07/2017	20/11/2017	24/07/2017	20/11/2017	
OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA				
NÚMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIO	OTROS
200-APAD-1019/16	24/08/2016					
CONVENIO	22/11/2016					
CONVENIO MODIFICATORIO	21/12/2016					
TOTAL						
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL		\$ 2'873,997.48				
MONTO DEL CONVENIO ADICIONAL		\$				
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA						
DESCRIPCION DEL PROYECTO:						
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CÓMPUTO (TRABAJOS PRELIMINARES Y DE CIMENTACIÓN), EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, UBICADA EN COL. VALLE DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE ECATEPEC, MÉXICO						
OBRA	AULAS	LABORATORIOS	TALLERES	ANEXOS	P. BENEFICIADA	
1	0	0	0	22	2200	



[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN TÉCNICA
 SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Los representantes de la Dependencia u Organismo de la operación, conservación y mantenimiento; de las Secretarías de la Contraloría y de Finanzas, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten. (Anexar hojas adicionales en caso necesario).

NOTA:
A la presente acta se deberán anexar los documentos complementarios necesarios como lo es el caso de copias de títulos de propiedad; carta de cesión de derechos sobre el terreno; documento de expropiación; observaciones sobre la calidad de la obra; ampliaciones previstas a la obra; convenio de operación de la obra; contratos celebrados de la obra; Convenio de Finiquito y aquellos que se consideren convenientes.

EN ESTE ACTO SE ENTREGA A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL ESCOLAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:


A).- PLANOS ACTUALIZADOS	SI	NO	NO APLICA
B).- MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SUMINISTRADOS Y/O COLOCADOS	SI	NO	NO APLICA
C).- GARANTÍA EQUIPOS SUMINISTRADOS Y/O COLOCADOS	SI	NO	NO APLICA
D).- CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGARON LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA	SI	NO	NO APLICA

ENTREGAN
DESARROLLO ALMAC, S.A. DE C.V.
[Firma]
C. MA. DOLORES ALCAZAR MORENO
ADMINISTRADOR ÚNICO
UNIDAD EJECUTORA

ING. JOAQUÍN MONROY GARCÍA SUPERVISOR DE OBRA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ING. BEATRIZ BURGOS BLAS SUPERVISOR DE LA OBRA AYUNTAMIENTO QUE OPERARÁ LA OBRA
<i>[Firma]</i> HERRERA	<i>[Firma]</i> COMUNIDAD Carmen del Rosario Kios Saldarña Tania Bibliotecaria
205V13000/8904/2017 NOMBRE, CARGO Y FIRMA	205V13000/8905/2017 NOMBRE CARGO Y FIRMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍAS DEL RAMO, Y/O DEPENDENCIAS NORMATIVAS
205V13000/8907/2017 NOMBRE, CARGO Y FIRMA	SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE FINANZAS	CONTRALORÍA
205V13000/8906/2017 NOMBRE, CARGO Y FIRMA	SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
205V13000/8908/2017 NOMBRE Y FIRMA	SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA

Quiénes asisten y sancionan como representantes autorizados de la unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

Anterior con fundamento a lo establecido por el Artículo 12.57 párrafo segundo del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y Artículo 232 de su Reglamento.



UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra


IMIFE-1934-CC-12016

Siendo las 14:30 del día 10 del mes de Agosto del año 2018, se reunieron el M. en G.E. Fidel Nuci Herrera, Secretario Administrativo; Ing. Jesús López Rosas cazar Moreno, Administrador único de la Constructora y Pavimentadora Almaguer, S. A. de C.V.; Ing. Beatriz Burgos Bias, Supervisora de Obras por el Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de México (IMIFE) ; así como el Ing. Peniel Octavio Peñaaloza Beristain , Contralor Interno, en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA					
Descripción de la Obra	Clave interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Términación de la Obra
Unidad Académica 1 edificio de dos plantas para aulas, 3a etapa Gerontología	IMIFE-1934-CC-12016		X	16/01/2017	14/06/2017

Obra de continuidad	SI (<input checked="" type="checkbox"/>)	NO (<input type="checkbox"/>)
Etapas Número	PRIMERA	

SEDE DE LA OBRA					
Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Av. Central S/N Esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Sección "A" Ecatepec de Morelos, Estado de México C.P. 55210 Tel.: 50 01 14 00 www.unive.edu.mx	VALLE DE ANÁHUAC	ECATEPEC DE MORELOS	15ESU0001H	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra

IMIFE-1934-CC-12016

TRABAJO EJECUTADO	
Construcción, nueva obra	X
Remodelación/Adecuación/Ampliación	

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	11
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	
Bibliotecas	
Auditorios	
C. de Cómputo	4
C. de Lenguas	
Aulas Magnas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	1
Anexos	25
Otros(SANTARIOS)	4

RECURSOS FAM	
A) Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2015
Monto aportado por el FAM	\$ 3,090,327.00
Monto total ejercido del FAM	\$ 3,090,327.00
Remanente	
Costo total de la Obra	\$ 3,090,327.00
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2014	6,178,195.85
Total aportado por FAM	\$ 9,268,522.85
Costo total de la Obra	\$ 9,268,522.85
Total metros cuadrados de la obra	2358

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el M. en G.E. Fidel Nuci Herrera, Secretario Administrativo; Ing. Jesús López Rosas, Administrador único de la Constructora y Pavimentadora Almaguer, S. A. de C.V.; Ing. Beatriz Burgos Blas, Supervisora de Obras por el Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de México (IMIFE), y el Ing. Peniel Octavio Peñaloza Beristain Contralor Interno de la UNEVE, hace(n) entrega de la misma, quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

Entrega
ING. JESÚS LÓPEZ ROSAS
 ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER, S.A. DE C.V.

Recibe
M. EN G.E. FIDEL NUCI HERRERA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA UNEVE

Testigo
ING. PENIEL OCTAVIO PEÑALOZA BERISTAIN
 CONTRALOR INTERNO DE LA UNEVE

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

Oficio No. 205V13000-0227/2018
Asunto: Invitación Entrega Oficial

Toluca, Estado de México, a 22 de Enero de 2018

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC COL. VALLE DE ANÁHUAC, ECATEPEC, MÉXICO. PRESENTE.


Por este conducto me permito informar a Usted, que el día 09 de Febrero de 2018 a las 12:00 horas, se llevará a cabo el acto de Entrega-Recepción de los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA 1 EDIFICIO DE DOS PLANTAS, TERCERA ETAPA GERONTOLOGÍA, EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, UBICADA EN COL. VALLE DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE ECATEPEC, MÉXICO , relativos al contrato No. IMIFE-1934-CC-I2016 , realizados por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

Lo anterior para que este acto se efectúe en la fecha y hora citados, en las instalaciones del plantel a su digno cargo.

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

ING. MAURICIO NAIME NEMER DIRECTOR TÉCNICO



c.c.p. CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER, S.A. DE C.V. Miembro. MMUMG/pgs.

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Unidad Académica
Sección de Supervisión de Obra
Paseo de la Universidad 1934, Col. Valle de Anáhuac, Ecatepec, Estado de México, C.P. 70500

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

En la localidad de COL. VALLE DE ANÁHUAC, del Municipio de ECATEPEC, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 09 de Febrero de 2018, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, la Empresa Contratista, la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Finanzas y de la Comunidad que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado:

"UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC"

PROGRAMA: CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ENCARGO 2016
 PARTIDA: OBRA NUEVA
 CODIGO: CC16017

UNIDAD EJECUTORA:		DATOS GENERALES				
'DEPENDENCIA QUE OPERARÁ LA OBRA:		INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		LA DIRECCION DEL PLANTEL.				
NUMERO DE CONTRATO:		CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER, S.A. DE C.V.		R.F.C.	CPA-020315-865	
		PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS				
ORIGINAL		CONTRACTUAL		REAL		
		INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO	
IMIFE-1934-CC-12016		16/01/2017	14/06/2017	16/01/2017	14/06/2017	
CONVENIO ADICIONAL						
OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA				
NÚMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICARIO	OTROS
203200-APAD-0736/15	02/06/2015					
20323A000/1638/2015	18/12/2015					
CONVENIO	18/12/2015					
TOTAL						
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL		\$ 3'087,626.37				
MONTO DEL CONVENIO ADICIONAL		\$				
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA						
DESCRIPCION DEL PROYECTO:						
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA 1 EDIFICIO DE DOS PLANTAS, TERCERA ETAPA GERONTOLOGÍA, EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, UBICADA EN COL. VALLE DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE ECATEPEC, MÉXICO						
OBRA	AULAS	LABORATORIOS	TALLERES	ANEXOS	P. BENEFICIADA	
1	11	0	0	25	3050	

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora o Compañía Constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proyecto y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México.

[Faint text at the bottom of the page, likely a footer or administrative note.]



UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra

IMIFE-2195-CC-I2016

Siendo las 14:30 del día 10 del mes de agosto del año 2018, se reunieron el M. EN G. E. Fidel Nuci Herrera, Secretario Administrativo; Ing. Jesús López Rosas cazar Moreno, Administrador único de la Constructora y Pavimentadora Almaguer, S. A. de C.V.; Ing. Beatriz Burgos Blas, Supervisora de Obras por el Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de México (IMIFE) ; así como el Ing. Peniel Octavio Peñalozza Beristain , Contralor Interno, en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:


DATOS GENERALES DE LA OBRA

Descripción de la Obra	Clave interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Términación de la Obra
Gimnasio edificio de una planta incluye visitantes de mujeres y hombres, cancha de basquetbol, tribunas 6 bodegas, sanitarios, vestibulo.	IMIFE-2195-CC-I2016		X	16/01/2017	14/06/2017

Obra de continuidad	SI (X)	NO ()
Etapas Número	PRIMERA	

SEDE DE LA OBRA

Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Av. Central S/N Esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Sección "A" Ecatepec de Morelos, Estado de México C.P. 55210 Tel.: 50 01 14 00 www.uneve.edu.mx	VALLE DE ANÁHUAC	ECATEPEC DE MORELOS	15ESU0001H	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC	UNIVERSIDAD ESTADAL DEL VALLE DE ECATEPEC



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave interna de identificación de la obra

IMIFE-2195-CC-12016

TRABAJO EJECUTADO	
Construcción, nueva obra	X
Remodelación/Adecuación/Ampliación	

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	Número
Aulas/Salones	
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	
Bibliotecas	
Auditorios	
C. de Cómputo	
C. de Lenguas	
Aulas Magnas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	1
Anexos	12
Otros(SANITARIOS)	4

RECURSOS FAM	
A) Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2015
Monto aportado por el FAM	\$ 2,909,412.00
Monto total ejercido del FAM	\$ 2,909,412.00
Remanente	
Costo total de la Obra	\$ 2,909,412.00
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
Total aportado por FAM	\$ 2,909,412.00
Costo total de la Obra	\$ 2,909,412.00
Total metros cuadrados de la obra	1260

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por la obra mencionada y acto seguido el M. en G.E. Fidel Nuci Herrera, Secretario Administrativo; Ing. Jesús López Rosas, Administrador Único de la Constructora y Pavimentadora Almaguer, S. A. de C.V.; Ing. Beatriz Burgos Blas, Supervisora de Obras por el Instituto de la Infraestructura Educativa del Estado de México (IMIFE), y el Ing. Peniel Octavio Peñaloza Beristain Contralor Interno de la UNEVE, hace(n) entrega de la misma, quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

Entrega
ING. JESÚS LÓPEZ ROSAS
 ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER, S.A. DE C.V.

Recibe
M. EN G.E. FIDEL NUCI HERRERA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA UNEVE

Testigo
ING. PENIEL OCTAVIO PEÑALOZA BERISTAIN
 CONTRALOR INTERNO DE LA UNEVE



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

Oficio No. 205V13000-8931/2017
Asunto: Invitación Entrega Oficial

Toluca, Estado de México, a 29 de Noviembre de 2017

RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
COL. VALLE DE ANÁHUAC
ECATEPEC, MÉXICO.
PRESENTE.


Por este conducto me permito informar a Usted, que el día 07 de Diciembre de 2017 a las 12:30 horas, se llevará a cabo el acto de Entrega-Recepción de los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN GIMNASIO 1 EDIFICIO DE UNA PLANTA QUE INCLUYE: VESTIDORES DE MUJERES Y HOMBRES, CANCHA DE BASQUETBOL, TRIBUNAS, 6 BODEGAS, SANITARIOS Y VESTÍBULO, EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, UBICADA EN LA COL. VALLE DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE ECATEPEC, MÉXICO, relativos al contrato No. IMIFE-2195-CC-12016, realizados por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

Lo anterior para que este acto se efectúe en la fecha y hora citados, en las instalaciones del plantel a su digno cargo.

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


ING. MAURICIO NAIME NEMER
DIRECTOR TÉCNICO


FIDEL NIER HERNANDEZ

c.c.p. CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER, S.A. DE C.V.
Minutario.
MNN/JMG/pgs.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA

BLVD. ISIDRO FABELANTE, NO. 900, COL. CAMINOS, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50020. TEL. 236-05-90 EXT. 2102



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

la localidad de COL. VALLE DE ANÁHUAC, del Municipio de ECATEPEC, Estado de México, siendo las 12:30 horas del día 07 de Diciembre de 2017, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, la Empresa Contratista, la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Finanzas y de la Comunidad que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado:

"UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC"

PROGRAMA: CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ENCARGO 2015
PARTIDA: OBRA NUEVA
CODIGO: CC15104

UNIDAD EJECUTORA:		DATOS GENERALES				
DEPENDENCIA QUE OPERARÁ LA OBRA:		INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		LA DIRECCION DEL PLANTEL				
NUMERO DE CONTRATO:		CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER, S.A. DE C.V.		R.F.C.	CPA-020315-865	
		PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS				
		CONTRACTUAL				
ORIGINAL	IMIFE-2195-CC-12016	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO	
CONVENIO ADICIONAL		16/01/2017	14/06/2017	16/01/2017	14/06/2017	
OFICIO (S) DE AUTORIZACIÓN		INVERSION AUTORIZADA				
NÚMERO.	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIO	OTROS
203200-APAD-0736/15	02/06/2015					
CONVENIO	05/11/2015					
TOTAL						
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL		\$ 2'845,119.15				
MONTO DEL CONVENIO ADICIONAL		\$				
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA						
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:						
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN GIMNASIO 1 EDIFICIO DE UNA PLANTA QUE INCLUYE: TIDORES DE MUJERES Y HOMBRES. CANCHA DE BASQUETBOL, TRIBUNAS, 6 BODEGAS, SANITARIOS Y VESTÍBULO, EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, UBICADA EN LA COL. VALLE DE ANÁHUAC, MUNICIPIO DE ECATEPEC, MÉXICO						
OBRA	AULAS	LABORATORIOS	TALLERES	ANEXOS	P. BENEFICIADA	
1	0	0	0	12	1200	

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de Inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta se exige a la Unidad Ejecutora o Compañía Constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proyecto, se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
BLVD. ISIDRO FABELA NTE. NO. 900, COL. 3 CAMINOS, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50020. TEL. 236-05-90 EXT. 2302
www.edomex.gob.mx

Los representantes de la Dependencia u Organismo de la operación, conservación y mantenimiento; de las Secretarías de Contraloría y de Finanzas, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten).
Anexar hojas adicionales en caso necesario).

NOTA:
A la presente acta se deberán anexar los documentos complementarios necesarios como lo es el caso de copias de títulos de propiedad; carta de cesión de derechos sobre el terreno; documento de expropiación; observaciones sobre la calidad de la obra; ampliaciones previstas a la obra; convenio de operación de la obra; contratos celebrados de la obra; Convenio de Finiquito y aquellos que se consideren convenientes.

EN ESTE ACTO SE ENTREGA A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL ESCOLAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

A).- PLANOS ACTUALIZADOS	SI	NO	NO APLICA
B).- MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SUMINISTRADOS Y/O COLOCADOS	SI	NO	NO APLICA
C).- GARANTÍA EQUIPOS SUMINISTRADOS Y/O COLOCADOS	SI	NO	NO APLICA
D).- CONSTANCIA DE QUE SE ENTREGARON LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA	SI	NO	NO APLICA

ENTREGAN
CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER, S.A. DE C.V.

ING. JESUS LÓPEZ ROSAS
ADMINISTRADOR ÚNICO
UNIDAD EJECUTORA

MVIIBN. JOAQUÍN MONROY GARCÍA
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DEPENDENCIA, ENTIDAD PÚBLICA O AYUNTAMIENTO QUE OPERARÁ LA OBRA

ING. BEATRIZ BURGOS BLAS
SUPERVISOR DE LA OBRA

Secretaría de Educación
Ing. Fidel Nuñez Ayerza
15/11/17

Comuna del Resarcu Pao Saldana
Técnico biblioteca

NOMBRE CARGO Y FIRMA

205V13000/8905/2017
NOMBRE CARGO Y FIRMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

205V13000/8904/2017
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SECRETARÍA DE FINANZAS

205V13000/8906/2017
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA

205V13000/8908/2017
NOMBRE Y FIRMA

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

Lo anterior con fundamento a lo establecido por el Artículo 12.57 párrafo segundo del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y Artículo 232 de su Reglamento.

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
BLVD. ISIDRO FABELA NTE. NO. 900, COL. 3 CAMINOS, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50020. TEL. 236-05-90 EXT. 2302
www.edomex.gob.mx
