



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



EDOMEX  
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

APR

205BG10000/723/2018

Ecatepec, Estado de México, a 10 de septiembre de 2018

DOCTOR  
ISAÍAS ELIZARRARAS ALCARAZ  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL DE LA DGESU SEP.  
P R E S E N T E



En atención a su oficio Núm. 511-3/2018.-0887 adjunto al presente el informe de avance mensual correspondiente al mes de agosto del presente año de las obras apoyadas con Recursos Federales del Programa "Fondo de Aportaciones Múltiples" Nivel Superior; Ejercicio Fiscal 2017 y 2018 de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.

Mucho agradeceré sus comentarios al respecto, además de aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE  
"Non nova, sed secus nova"




M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ  
RECTOR



C.c.p Dr. Salvador A. Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria SEP.- Presente  
M. en AP. Isabel González Riestra, Jefa del Departamento de Sistemas de Información SEP.- Presente

ANEXA  
I.C.D.



Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior  
Dirección General de Educación Superior  
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

Av. Central S/N Esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Sección A  
Ecatepec de Morelos, Estado de México C.P. 55210 Tel.: 50 01 14 00  
www.uneve.edu.mx



Oficio Núm. 511-3/2018.-0887

- (1) Se encuentra en firma el contrato de obra. Derivado de que es una obra de continuidad se destinará el contrato a la misma constructora una vez firmado el contrato.
- (2) Se encuentra en firma el contrato de obra. Al término de la firma de contrato se dará inicio con el mantenimiento
- (3) Se encuentra en firma el contrato de obra. Al término de la firma de contrato se dará inicio con la sustitución de luminarias.

En el Reporte Fotográfico, es importante que en el apartado “Croquis de Localización”, se señale la ubicación específica a intervenir; así mismo en el recuadro “Referencia de Fotos en Croquis”, esté presente la referencia a cada fotografía representada y en la “Ubicación de la obra o proyecto”, favor de incluir la dirección postal de la obra, tal y como se indica en el “Instructivo de llenado del informe de Avance FAM 2018”.

Agradezco el envío de las Actas Administrativas de Entrega-Recepción, con lo que se da por concluido el seguimiento Académico-Administrativo de las siguientes obras:

Año	Prioridad	Obra
2015	1	Construcción del Centro de Investigación de Ingeniería Industrial, para la DES Tecnológica.
2015	2	Gimnasio 1 edificio de una planta incluye vestidores de mujeres y hombres, cancha de basquetbol, tribunas, 6 bodegas, sanitarios, vestíbulo.
2016	1	Edificio para el Centro de Computo 1 de una planta.

Finalmente, le comento que el FAM, al tratarse de recursos federales, deberán sujetarse a lo establecido en La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en su Artículo 17, que a la letra dice:

*“Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación las transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.*

*Sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes”.*



Oficio Núm. 511-3/2018.-0887

Sin otro particular, reciba mis más cordiales saludos.

**ATENTAMENTE**



S. E. P.

**ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO  
INSTRUCIONAL  
**DIRECTOR**

Turno: 2304-18

c.c.p. Dr. Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior. - Presente  
Dr. Salvador A. Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria. - Presente  
M. en G. Fidel Nuci Herrera, Secretario Administrativo de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. - Presente

Av. Universidad No. 1200, 5º. Piso Sección 21, Col. Noyo, Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.  
Tel (55) 3600-2511 Ext. 65644. <http://www.dgesu.sep.gob.mx>

BEA/RG/IM/ccsm/vci

2018

AÑO



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto-2018

FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

Entidad federativa: Estado de México

Clave Inst 911: 15MSU0923T

RESPONSABLES

Planeación  
Nombre: M. EN G.E. ELIAS OMAR SALCEDO MARTÍNEZ  
Cargo: JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN  
Teléfono: 01 (55) 5031-1400 EXT. 101 204  
Correo electrónico: uppe@unve.edu.mx

Obras y Mantenimiento  
Nombre: M. EN G.E. FIDEL NUCI HERRERA  
Cargo: SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
Teléfono: 01 (55) 5031-1400 EXT. 104 126  
Correo electrónico: aadministracion@unve.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
		Obra de construcción	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)
1	3ª Etapa de la Construcción de un Centro de Cómputo	X				\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00			1179.00		SE ENCUENTRA EN FIRMA EL CONTRATO DE OBRA	DERIVADO QUE ES UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN SE DESTINARA EL CONTRATO A LA MISMA CONSTRUCTORA UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO	0%	01/08/18	30/12/18	PENDIENTE EL INICIO					
6	Mantenimiento al Edificio de la Clínica Integral Universitaria (pintura Int. Ext. Impermeabilización, cristales, albanilería en pisos y plafón.		X			\$ 1,615,780.46	\$ 1,615,780.46			580		SE ENCUENTRA EN FIRMA EL CONTRATO DE OBRA	AL TÉRMINO DE LA FIRMA DEL CONTRATO SE DARÁ INICIO AL MANTENIMIENTO	0%	01/08/18	30/12/18	PENDIENTE EL INICIO					
7	Sustitución y Colocación de 86 Luminarias dobles con baterías y Paneles Solares		X			\$ 2,064,000.00	\$ 2,064,000.00			1260.00		SE ENCUENTRA EN FIRMA EL CONTRATO DE OBRA	A TÉRMINO DE LA FIRMA DEL CONTRATO SE DARÁ INICIO A LA SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS	0%	01/08/18	30/12/18	PENDIENTE EL INICIO					
						\$9,679,780.46	\$9.00	\$9,679,780.46		0	1179											

M. EN A. JORGE JESUS GARCIA MARTINEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES

M. EN G.E. FIDEL NUCI HERRERA  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar más filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en los dígitos: dd, mm y aa.

2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Agosto-2018

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INGRESO DE AVANCE DE OBRA

1 Nombre de la obra: 3ª Etapa de la Construcción de un Centro de Cómputo

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Porcentaje de avance

0%




F1: Fachada principal



F2: Lateral



F3: Fachada posterior

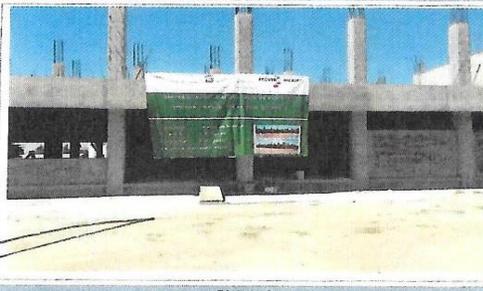

F4: Entrada



F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

PENDIENTE POR INICIO DE LA 3ª ETAPA


M. EN G. ENGEN. ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

M. EN G. ENGEN. NUCI HERRERA

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

<b>2018</b> AÑO	<b>FAM</b> FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE NIVEL UNIVERSITARIO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIOS	Mes reportado <b>01/08/2018</b> FECHA DE COSTEO
REPORTE FOTOGRAFICO DEL ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO			
 Porcentaje de avance <b>0%</b>	Nombre de la obra: <b>Mantenimiento al Edificio de la Clínica Integral Universitaria (Pintura Int. Ext. Impermeabilización, Cristales, Albañilería en pisos y plafón).</b> CIRCULO DE LOCALIZACIÓN 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 
 F1: Fachada principal	 F2: Entrada	Comentarios de los trabajos realizados: PENDIENTE POR LA FIRMA DEL CONTRATADO CEM	
 F3: Fachada posterior	 F4: Entrada	 F5: Interior de sala	
M. ENRIQUE MELAZAR GARCÍA MARTÍNEZ Nombre y firma del Titular de la IES		M. ENRIQUE FIDEL RIVERA Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES	
* Es más importante que se anexe reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra			

AV. MORELOS 4000, RY 5A, BDO. LEONVIGARIO DEL VALLE DE ANAHUAC, CP 35210

2018

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA SALUD EN LA ESCUELA

Mes reportado  
**Agosto -2018**  
FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

7

Nombre de la obra

**Sustitución y Colocación de 86 Luminarias dobles con baterías y Paneles Solares**




Porcentaje de avance

**0%**



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ESTACION DEL METRO ECATEPEC ESTACION DEL METRO ECATEPEC



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AY HARK GONZALEZ SINESIO LERMA VICARIO COL VALLE DE ANAHUAC SECCION A' Q P 55210



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:  
PENDIENTE POR LA FIRMA DEL CONTRATADO DE OBRA.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

M. EN A. VILLALBA ELIZABETH GARCIA MARTINEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

M. EN O. E. FIDEL NUCI HERRERA

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y reparaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra



Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2018  
Oficio Núm. 511-3/2018.-0887

**M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ  
RECTOR  
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC  
PRESENTE**

En relación a su atento Oficio No. 205BG10000/655/2018, mediante el cual envía los informes de avance de las obras apoyadas a través de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 y 2018, así como las Actas de Entrega-Recepción de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, de la institución que dignamente dirige, correspondientes al mes de julio de 2018.

Comunico a usted, que como resultado de la revisión a los documentos anexos al oficio arriba citado, la Dirección General de Educación Superior Universitaria a través de esta Dirección de Fortalecimiento Institucional, ha tomado nota y actualizado sus registros, quedando de la siguiente forma:

FAM 2017							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	% avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	Unidad Académica edificio de dos plantas para aulas última Etapa de Gerontología.	24,335.07	24,335.07	0.00	100.00	09/10/16	01/03/18
2	Segunda Etapa del Edificio para el Centro de Computo de 1 planta.	4,700,000.00	4,699,985.43	14.57	100.00	09/10/17	01/03/18
3	Tercera Etapa del Gimnasio edificio de una planta incluye vestidores de mujeres y hombres, cancha de basquetbol, tribunas 6 bodegas, sanitarios, vestíbulo. (1)	3,000,000.00	2,005,000.00	995,000.00	70.00	09/10/17	01/03/18
<b>Total</b>		<b>7,724,335.07</b>	<b>6,729,320.50</b>	<b>995,014.57</b>	<b>90.00</b>		

(1) Pendiente el pago de la tercera y última estimación

Para la obra No. 3, se observa que la fecha de término ya está vencida, favor de actualizarla.

FAM 2018							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	% avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	Tercera Etapa de la Construcción de un Centro de Cómputo. (1)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	01/08/18	30/12/18
2	Mantenimiento al Edificio de la Clínica Integral Universitaria (pintura Int. Ext. Impermeabilización, cristales, albañilería, en pisos y plafón). (2)	1,615,780.46	0.00	1,615,780.46	0.00	01/08/18	30/12/18
3	Sustitución y Colocación de 86 Luminarias dobles con baterías y paneles solares. (3)	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	0.00	01/08/18	30/12/18
<b>Total</b>		<b>9,679,780.46</b>	<b>0.00</b>	<b>9,679,780.46</b>	<b>0.00</b>		



Oficio Núm. 511-3/2018.-0887

- (1) Se encuentra en firma el contrato de obra. Derivado de que es una obra de continuidad se destinará el contrato a la misma constructora una vez firmado el contrato.
- (2) Se encuentra en firma el contrato de obra. Al término de la firma de contrato se dará inicio con el mantenimiento
- (3) Se encuentra en firma el contrato de obra. Al término de la firma de contrato se dará inicio con la sustitución de luminarias.

En el Reporte Fotográfico, es importante que en el apartado “Croquis de Localización”, se señale la ubicación específica a intervenir; así mismo en el recuadro “Referencia de Fotos en Croquis”, esté presente la referencia a cada fotografía representada y en la “Ubicación de la obra o proyecto”, favor de incluir la dirección postal de la obra, tal y como se indica en el “Instructivo de llenado del informe de Avance FAM 2018”.

Agradezco el envío de las Actas Administrativas de Entrega-Recepción, con lo que se da por concluido el seguimiento Académico-Administrativo de las siguientes obras:

Año	Prioridad	Obra
2015	1	Construcción del Centro de Investigación de Ingeniería Industrial, para la DES Tecnológica.
2015	2	Gimnasio 1 edificio de una planta incluye vestidores de mujeres y hombres, cancha de basquetbol, tribunas, 6 bodegas, sanitarios, vestíbulo.
2016	1	Edificio para el Centro de Computo 1 de una planta.

Finalmente, le comento que el FAM, al tratarse de recursos federales, deberán sujetarse a lo establecido en La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en su Artículo 17, que a la letra dice:

*“Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación las transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.*

*Sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes”.*



Oficio Núm. 511-3/2018.-0887

Sin otro particular, reciba mis más cordiales saludos.

**ATENTAMENTE**



S. E. P.  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

**ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ**  
DIRECTOR

Turno: 2304-18

c.c.p. Dr. Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior. - Presente  
Dr. Salvador A. Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria. - Presente  
M. en G. Fidel Nuci Herrera, Secretario Administrativo de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. - Presente

Av. Universidad No. 1200, 5º. Piso Sección 21, Col. Xoco, Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.  
Tel (55) 2600-2511 Ext. 65644. <http://www.dgesu.sep.gob.mx>

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: 01 AL 31/08/2018

Fecha de elaboración del Documento: 06/09/2018

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>		<b>Planeación</b>	
<b>Nombre de la Institución:</b> Universidad Estatal del Valle de Ecatepec		<b>Nombre</b> M. EN G.E. ELIAS OMAR SALCEDO MARTÍNEZ			
<b>Entidad Federativa:</b> Estado de México		<b>Cargo</b> Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación			
<b>Clave Inst 911:</b> 15MSU0923T		<b>Teléfono</b> 51011400 ext 101 o 204			
		<b>Correo electrónico</b> uippe@uneve.edu.mx			

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MÓNTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				AVANCE						
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la obra
			Nombre	Monto								
1	Unidad Académica edificio de dos plantas para aulas 3ra Etapa de Gerontología	24,335.07			24,335.07	2359	100%	24,335.07	0	CON LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN AL EXTERIOR DEL EDIFICIO SE CONCLUYÓ LA OBRA	DERIVADO A LAS PRUEBAS DE ILUMINACIÓN SE RETRASÓ LA ENTREGA DE LA OBRA	CON EL PAGO DE ESTIMACIÓN SE HA EN SU TOTALIDAD E ASIGNADO
2	Segunda Etapa del Edificio para el Centro de Cómputo de 1 planta	4,700,000.00			4,700,000.00	1179	100%	4,699,985.43	14.57	ESTA OBRA ES DE CONTINUIDAD SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN LA SEGUNDA ETAPA MEDIANTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA UNEVE/AG/COPI/16/122017	ACTUALMENTE YA SE ADJUDICÓ EL CONTRATO A LA EMPRESA DERIVADO A QUE ES LA MISMA CONSTRUCTORA POR ELLO NO SE HA DETENIDO LA OBRA RAZÓN POR LA QUE REPRESENTA AVANCE FÍSICO	CON EL PAGO DE ESTIMACIONES EJERCIDO EN SU TOTALIDAD RECURSO ASIGNADO A LA OBRA ESTA AL
3	Tercera Etapa del Gimnasio edificio de una planta incluye vestidores de mujeres y hombres, cancha de basquetbol, tribunas 6 bodegas, sanitarios, vestíbulo.	3,000,000.00			3,000,000.00	1260	70%	2,005,000.00	995,000.00	ESTA OBRA ES DE CONTINUIDAD SE ENCUENTRA EN LA TERCERA ETAPA YA SE ELABORÓ EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	SE TIENE UN AVANCE DEL 85% DE LA OBRA.	PENDIENTE EL PAGO DE LA TERCERA Y ÚLTIMA ETAPA
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7,724,335.07</b>		<b>0.00</b>	<b>7,724,335.07</b>	<b>4,798.00</b>						

Empresa	Fuente de Financiamiento FAM 2017	Estimaciones	N° factura	fecha de pago	N° Poliza	Cheque N°	Ejercido	x Ejercer	Menos deducciones 0.5% DE M.C.H.I.C	TOTAL A PAGAR	
Unidad Académica edificio de dos plantas para aulas 3ra Etapa de Gerontología	Desarrollo Almac S A de C V	1	1092	17/04/2018	51	13350	24,335.07				
							<u>24,335.07</u>				
Segunda Etapa del Edificio para el Centro de Cómputo de 1 planta	Desarrollo Almac S A de C V	1	234	14/02/2018		13119	1,822,118.31		7,853.96	1,	
		2	241	08/03/2018		13231	1,816,018.19		7,828.66	1,	
		3		08/03/2018				866,456.00		3,734.72	
		4	270	08/05/2018	24	13442	195,392.93		842.21		
						<u>4,699,985.43</u>	14.57				
Tercera Etapa del Gimnasio edificio de una planta incluye vestidores de mujeres y hombres, cancha de basquetbol, tribunas 6 bodegas.	Desarrollo Almac S A de C V	1	607	25/05/2018	86	13503	1,005,000.00		4,331.90	1,	
		2	608	28/05/2018	89	13513	1,000,000.00		4,310.34	1,	
						<u>3,000,000.00</u>	995,000.00				
						<u>7,724,335.07</u>	<u>6,729,320.50</u>	995,014.57			

M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ

Nombre y firma del Titular de la Institución

M. EN G.E. ELIAS OMAR SALCEDO MARTÍNEZ

Nombre y firma del Responsable de Planeación

M. EN G.E. FIDEL NUÑE HERRERA

Nombre y firma del Responsable de Infraestructura



E EJECUCIÓN DE LA OBRA		SEDE DE LA OBRA										MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO							
Fecha probable de inauguración	Programada	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB	
		Número	Nombre	Número	Nombre					No.	Nombre					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	
01/03/2018	01/10/2018	15.00	MÉXICO	33	ECATEPEC DE MORELOS	Av. Central s/n Col Valle de Anahuac sección "A" C.P. 55210	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	1	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	0	0	12.00	360.00	0.00	0.00	2.00	6
01/03/2018	01/10/2018	15.00	MÉXICO	33	ECATEPEC DE MORELOS	Av. Central s/n Col Valle de Anahuac sección "A" C P 55211	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	1	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	0	0	2.00	60.00	0.00	0.00	7.00	21
01/10/2018	01/12/2018	15.00	MÉXICO	33	ECATEPEC DE MORELOS	Av. Central s/n Col Valle de Anahuac sección "A" C.P. 55212	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	1	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
												0.00	0.00			0.00	14	420	0	0	9





