



"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

**Rectoría**

Asunto: **Tercer avance FAM 2021**

Ecatepec de Morelos, Estado de México,  
a 27 de septiembre de 2021.

**210C24010/450/2021**

**Doctor  
Isaías Elizarraraz Alcaraz  
Director de Fortalecimiento Institucional.**


Estimado doctor:

Envío a usted el **tercer informe de avance trimestral (julio-septiembre) de las obras apoyadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021** en formato PDF y Excel, de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, con la finalidad de dar atención al correo electrónico del 24 de septiembre de 2021 y cumplir con los avances de obras.

Agradezco de antemano su atención, a la vez que le envío un cordial saludo.

**Atentamente**  
**"Non nova, sed succu nova".**

**Maestro José Arturo Camacho Linares  
Rector**



C.C.P. C.P. Eder Josseman Castro Martínez, Secretario Administrativo  
Mónica Zúñiga Salas, Jefa de la Unidad de Información Planeación, Programación y Evaluación  
Archivo/minutario  
JACL/mzs

**Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Educación Superior y Normal  
Dirección General de Educación Superior  
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec  
Rectoría**

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Septiembre

2021

FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre **Universidad Estatal del Valle de Ecatepec**

Entidad federativa: Estado de México

Clave Inst 011 15MSU023T

RESPONSABLES

Nombre: MONICA ZUÑIGA SALAS  
Cargo: JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN  
Teléfono: 01 (55) 5001-1400 EXT. 101, 204  
Correo electrónico: uapp@uneve.edu.mx

Nombre: C.P. EDER JOSSEMAN CASTRO MARTÍNEZ  
Cargo: SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
Teléfono: 01 (56) 5001-1400 EXT. 104, 136  
Correo electrónico: s.administracion@uneve.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Casos)	Si ya fue inaugurada						
		Obras de construcción	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con Actas					
																				¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recapadón (Acta Recapadón)	Acta Administrativa de Entrega-Recapadón	Monto de Acta Administrativa	
1	3a. Etapa de la Construcción de un Edificio Multifuncional de Laboratorios y Talleres.	X				\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000.00	Laboratorios	7	500.00	n/a	n/a	0%	01/05/21	30/12/21	Se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México el oficio de autorización de los recursos para su liberación ante la Dirección General de Inversión del GEM.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
					Área de asesores o jefaturas	1	420.00																		
					Módulo de sanitarios	1	120.00																		
					Simulador de comedor	1	200.00																		
					Aulas	2	180.00																		
					Laboratorios CAD	2	180.00																		
					<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>1600</b>																		
2	Construcción de la Subestación eléctrica para alimentar de energía el edificio del Centro de Cómputo	X				\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	Espacio	1	1600.00	n/a	n/a	0%	01/05/21	30/12/21	Se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México el oficio de autorización de los recursos para su liberación ante la Dirección General de Inversión del GEM.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
3	Equipamiento de Mobiliario para el Edificio Multifuncional de Laboratorios y Talleres	X				\$ 1,992,086.94	\$ -	\$ 1,992,086.94	Bancos Universitarias	350		n/a	n/a	0%	01/05/21	30/12/21	Se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México el oficio de autorización de los recursos para su liberación ante la Dirección General de Inversión del GEM.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
					Mesas con sillas	20																			
					Mesas laboratorios	20																			
					Aire acondicionado	24																			
					<b>TOTAL</b>	<b>414</b>	<b>0</b>																		
						\$11,492,086.94	\$0.00	\$11,492,086.94																	

MTRO. JOSÉ ARTURO CHAVEZ LINARES  
Recto

Nombre y firma del Titular de la IES

C.P. EDER JOSSEMAN CASTRO MARTÍNEZ  
Secretario Administrativo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar hasta fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que tendrán reflejo en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos dd, mm y aa.

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre 2021

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

PRIOIDAD 1

Nombre de la obra

3ra. ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio F Multifuncional de laboratorios y talleres, Av. Central s/n. esquina Leona Vicario, código postal 55210, colonia Valle de Anáhuac Sección A. Ecatepec de Morelos Estado de México.

FOTOS

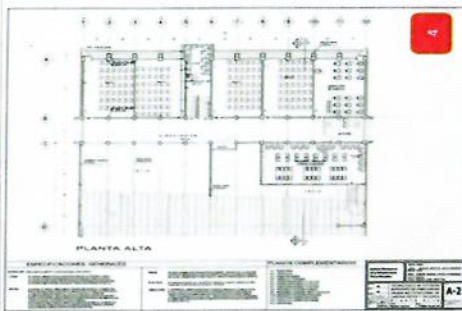

F1: Fachada principal Edificio

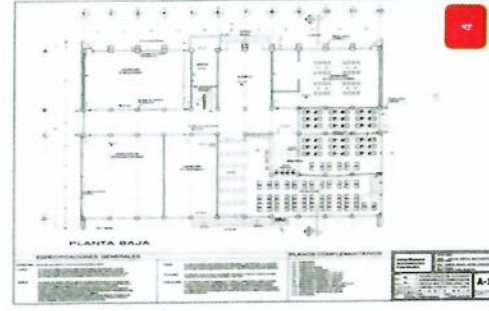

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

En espera del oficio por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.



F3: Entrada



F4: Ubicación Subestación Eléctrica



F5: Interior de aula para equipamiento

MTRO. JOSÉ ARTURO CANACHO LÓPEZ  
Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

C.P. EDER JOSSEPHIN CASTRO MARTÍNEZ  
Secretario Administrativo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
