

“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”

Rectoría

Asunto: **Cuarto Informe FAM 2021.**

Ecatepec de Morelos, Estado de México,
a 7 de enero de 2022.

210C24010/007/2022

Doctor
Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional.

Estimado doctor:

Envío a usted el cuarto informe de avance trimestral (octubre-diciembre) de las obras apoyadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2021 en formato PDF y Excel, de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, con la finalidad de dar atención al correo electrónico del 3 de enero de 2022 y cumplir con los avances de obras.

Agradezco de antemano su atención, a la vez que le envío un cordial saludo.

Atentamente
“Non nova, sed secus nova”.

Maestro José Arturo Camacho Linares
Rector



C.C.P. C.P. Eder Josseman Castro Martínez, Secretario Administrativo
Mónica Zúñiga Salas Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.
Archivo/minutario
JACU/mzs



Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Superior y Normal
Dirección General de Educación Superior
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
Rectoría

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Enero

2022

FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

Entidad federativa: Estado de México

Clave Inst 911.15MSU0923T

RESPONSABLES

Planación
Nombre: MONICA ZUÑIGA SALAS
Cargo: JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Teléfono: 01 (55) 5001-1400 EXT. 101, 204
Correo electrónico: uippe@uneve.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: C.P. EDER JOSSEMAN CASTRO MARTÍNEZ
Cargo: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Teléfono: 01 (55) 5001-1400 EXT. 104, 126
Correo electrónico: s.administracion@uneve.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Obras de construcción	Equipo	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Especio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con Actas				
																				¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	3a. Etapa de la Construcción de un Edificio Multifuncional de Laboratorios y Talleres.	X				\$ 7,855,226.91	\$ 4,530,109.65	\$ 3,325,117.26	Laboratorios	7	500.00	n/a	n/a	50%	30/09/21	30/03/22	Oficio de autorización del uso de remanentes 511/2021-4196	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
								Área de sensores o jefaturas	1	420.00														
								Módulo de sanitarios	1	120.00														
								Simulador de comedor	1	200.00														
								Aulas	2	180.00														
								Laboratorios CAD	2	180.00														
								TOTAL	14	1600														
2	Adquisición de una Subestación Eléctrica con el objeto de alimentar el edificio del Centro de Cómputo	X				\$ 1,497,995.00	\$ 1,497,995.00	\$ -	Espacio	1	1600.00	n/a	n/a	100%	01/05/21	30/12/21	Oficio de autorización del nombre del proyecto 511/2021-305B	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
3	Equipamiento de Mobiliario para el Edificio Multifuncional de Laboratorios y Talleres	X				\$ 2,138,866.03	\$ 1,397,253.28	\$ 741,612.75	Bancas Universitarias	350		n/a	n/a	50%	01/05/21	30/03/22		n/a	n/a	n/a	n/a			
								Mesas con sillas	20															
								Mesas laboratorios	20															
								Aire acondicionado	24															
								TOTAL	414	0														
						\$11,492,068.94	\$7,425,357.93	\$4,066,729.01																

MTRO. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
Rector
Nombre y firma del Titular de la IES

C.P. EDER JOSSEMAN CASTRO MARTÍNEZ
Secretario Administrativo
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado

Enero 2022

FECHA DE CORTE:


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: 3ra. ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES.




Porcentaje de avance

0%

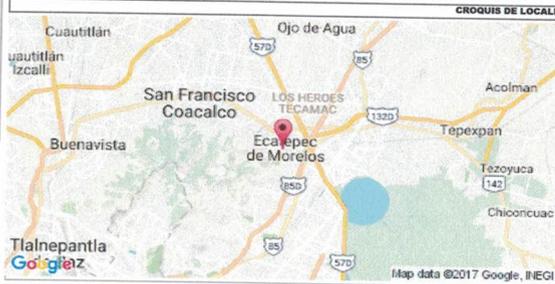


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio F Multifuncional de laboratorios y talleres, Av. Central s/n, esquina Leona Vicario, código postal 55210, colonia Valle de Anáhuac Sección A. Ecatepec de Morelos Estado de México.

FOTOS

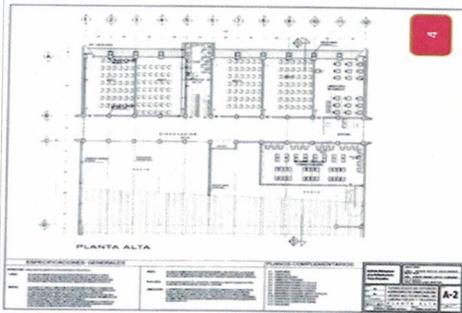

F1: Fachada principal Edificio

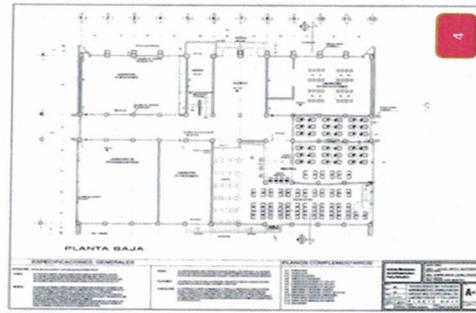

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Entrada



F4: Ubicación Subestación Eléctrica



F6: Interior de aula para equipamiento

Mtro. JOSÉ ARTURO CAMACHO LINARES
Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

C.P. EDEAR RAMÍREZ GARCÍA MARTÍNEZ
Secretaría de Administración

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
