



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



**EDOMÉX**  
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

**210C24010/366/2020**  
**Ecatepec, Estado de México,**  
**a 10 de Julio de 2020**

**DOCTOR**  
**ISAÍAS ELIZARRARAS ALCARAZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO**  
**INSTITUCIONAL DE LA DGESU SEP.**  
**PRESENTE**

Con el propósito de dar cumplimiento a los avances de obra, adjunto al presente el informe correspondiente al 2° Trimestre de 2020 de las obras apoyadas con Recursos Federales del Programa "Fondo de Aportaciones Múltiples" Nivel Superior; para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020 de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.

Mucho agradeceré sus comentarios al respecto, además de aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
*"Non nova, sed secus nova"*

**M. EN A. JOERGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ**  
**RECTOR**

C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta. - Directora General de Educación Superior Universitaria SEP.- Presente

Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Educación Superior y Normal  
Dirección General de Educación Superior  
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

Av. Central S/N Esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Sección "A" Ecatepec de Morelos, Estado de México C.P. 55210 Tel.: 50 01 14 00 [www.uneve.edu.mx](http://www.uneve.edu.mx)

2019  
AÑO

**FAM**  
FORO DE INICIATIVAS MULTISectoriales

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Junio 2020  
MES DE CORTE

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE PERIÓDICO**  
UNIVERSIDAD ESCARTEL DEL VALLE DE ECATEPEC

**Nombre:** Universidad Escartel del Valle de Ecatepec  
**Entidad Federativa:** Estado de México  
**Ciudad:** San Mateo Atlix, Puebla

**Nombre:** M. EN G. E. FELIX NACHERRERA  
**Cargo:** SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
**Teléfono:** 01 (55) 5591-1403 EXT. 154 136  
**Correo electrónico:** f.nacherrera@univ.mx



**INDICADORES DEL AVANCE DEL PROYECTO**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejecutado	Restante	Avance del proyecto en cuanto a espacio físico, material, cuadrado y tipo de proyecto 1			Acciones por realizar	% de avance	Fecha 2		Observaciones	¿Es susceptible de ser cancelado? (Causas)		¿Ya fue resguardado?		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento y/o infraestructura	Investigación	Proyecto tecnológico				Etiquetas	Material	Costos			Inicio	Termino		¿Cuenta con el acta de resguardo?	¿Causas?	Inicio	Termino	Acta de Recepción	Acta de Entrega-Asignación		
1	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES CON EQUIPAMIENTO (OBRA NUEVA)	X				\$ 16,802,700.78	\$ 16,802,700.78	\$ -	1	2,170		100%	15/07/19	31/03/20	1. Con la realización de los trabajos de construcción, en la "Sección del Gobierno del Estado de México", por el artículo 333 CC-2019 se otorgó la obra a la Empresa Cabasa Ingeniería y Servicios, S. de C.V. y 50% del contrato, el resto se depositó en una cuenta por pagar para ser cancelada en una fecha. Con el fin de asegurar el cumplimiento de la obra, se realizó el primer pago correspondiente. 3. Continúa a la espera de la cancelación de la prima de la prima de esta póliza de seguro de construcción de la obra. 4. Se continúa la primera cancelación de la prima de la prima de esta póliza de seguro de construcción de la obra. 5. Continúa a la espera de la cancelación de la prima de la prima de esta póliza de seguro de construcción de la obra.									
<b>TOTAL</b>									1	2,170		100%	15/07/19	31/03/20										
						\$16,802,700.78	\$16,802,700.78	\$ -																

Nombre y firma del Titular de la IES  
**FELIX NACHERRERA**

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se clasifican los espacios que corresponden a la obra o proyecto. Se pueden incluir tanto bienes como sus recursos.  
2 En esta sección se registra el monto de bienes y servicios contratados y recibidos, independientemente de su estado de pago.  
3 Es importante que los datos de inicio y término sean correctos. Tanto en días como en meses y años.

2019

FAM

PUNTO DE ENTREGAS MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FESCA

Mes reportado

Junio 2020


FECHA DE COPIE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE SEMANAL

1 Nombre de la obra:



CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES CON EQUIPAMIENTO (OBRA NUEVA)

CIROURE DE LOCALIZACION

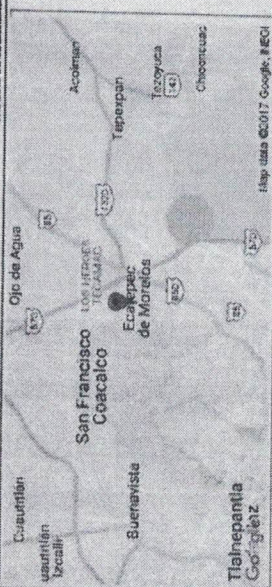


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

AV. MEXICO (CALLE) EN EL CARRILLO VICARIO CUL. VALLE DE AMAHUAC, C.P. 28018




Fecha Principal de la Entrada



Estacion del Metro Escobeco



FOTOS

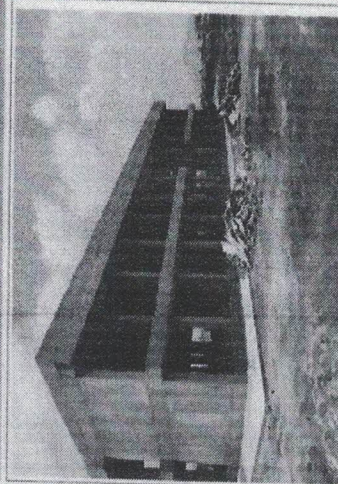

Comentarios de los trabajos realizados:

Con la Autorización de Pago AP-232687 la LINEVE Libero el 80% de los recursos destinados para esta obra, ante la Tesorería del Gobierno del Estado de México, en espera que el Instituto Mexicano de la Infraestructura Física Educativa (IMEFE) emita el Contrato de Obra firmado para otorgar el anticipo a la Constructora e inicia la Obra. Mediante el Contrato de Obra IMIFE-532-CC-L2019 fecha la Obra, se entregó al 30% de anticipo con la Intervención Bancaria 190 21009450215

Se cubre el pago de la primera estimación, la obra ya alcanza el 77% en su primera Etapa. Se cubrió el pago de la segunda estimación, la obra ya alcanza el 87% en su primera Etapa.

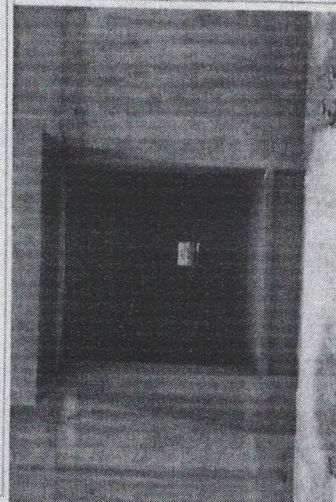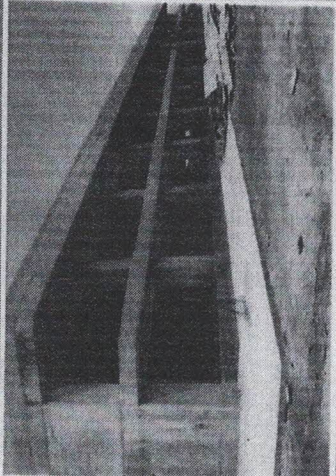

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de la IES

\* Es muy importante que se realice el seguimiento fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se pueden copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y reparaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DEL PROGRAMA DE AVANZADO MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Estatal del Valle de Ecatepec**  
 Clave del Proyecto: **1201000337**  
 Nombre del Responsable: **M. ERIC E. ELIAS GUERRA ROLDAN MARTINEZ**  
 Cargo: **JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION**  
 Telefono: **01 (55) 5001-4000 EXT. 105, 204**  
 Correo electronico: **egp@unvalle.edu.mx**

Nombre del Responsable: **M. ERIC E. ELIAS GUERRA ROLDAN MARTINEZ**  
 Cargo: **SECRETARIO ADMINISTRATIVO**  
 Telefono: **01 (55) 0001-4000 EXT. 104, 178**  
 Correo electronico: **l.administracion@unvalle.edu.mx**

Nombre del Proyecto: **2º ETAPA DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CUERPO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto asignado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	4. de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser cancelado? <sup>4</sup>	Cuenta con Acta	
		Obras de infraestructura	Equipamiento y mobiliario	Investigación				Español	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Terminado			Acta de Inicio de Obra	Acta de Finalización de Obra
1	2º ETAPA DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CUERPO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	X			\$ 4,786,565.00	\$	\$ 4,786,565.00	1	2120.00		En espera del estado de autorización de pago al IMFC por el contrato de obra con el Estado de México.	Por lo anterior se solicitó al IMFC proveer el contrato de obra con el Estado de México.	0%	01/05/20	30/12/20	1.- Con el folio N° 20700000-9940-DI-0020 que genera la Dependencia de Finanzas del Laboratorio de los Números 2. Con la entrega del Expediente Técnico a la Dirección General de Operación y Mantenimiento de las Edificaciones de la Universidad con la Autorización de pago (P. 208835). 3.- Pendiente la firma del contrato con el IMFC.			
	TOTAL									2120									
				TOTAL	\$4,786,565.00	\$0.00	\$4,786,565.00		0	0.00									

M. ERIC E. ELIAS GUERRA ROLDAN MARTINEZ

1. En espacios que cancelan a la obra o proyecto, los datos se cancelan en el informe de avance.  
 2. En esta posición se muestran de forma breve y concisa las acciones realizadas, así como los avances que se reportan, siempre que se reporten actividades en el reporte fotográfico.  
 3. Es importante que las fechas de inicio y término sean actuales.  
 4. Se debe dar seguimiento a las acciones que se reportan en el reporte de avance.

Nombre del Responsable de Obras y Mantenimiento de las OBRAS: *[Firma]*  
 Nombre del Responsable de Obras y Mantenimiento de las OBRAS: *[Firma]*

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MULTIAJES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA





Mes reportado  
**JUNIO 2020**  
FECHA DE CONTEO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE MENSUAL

1 Nombre de la obra

2ª ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES.


CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN

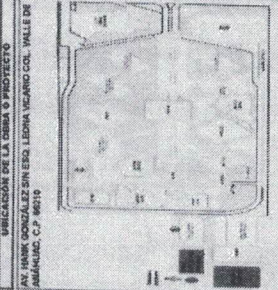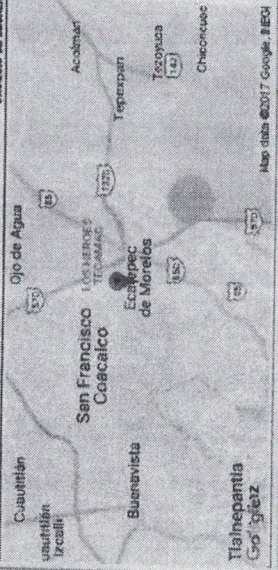

Porcentaje de avance

**0%**

FOTO

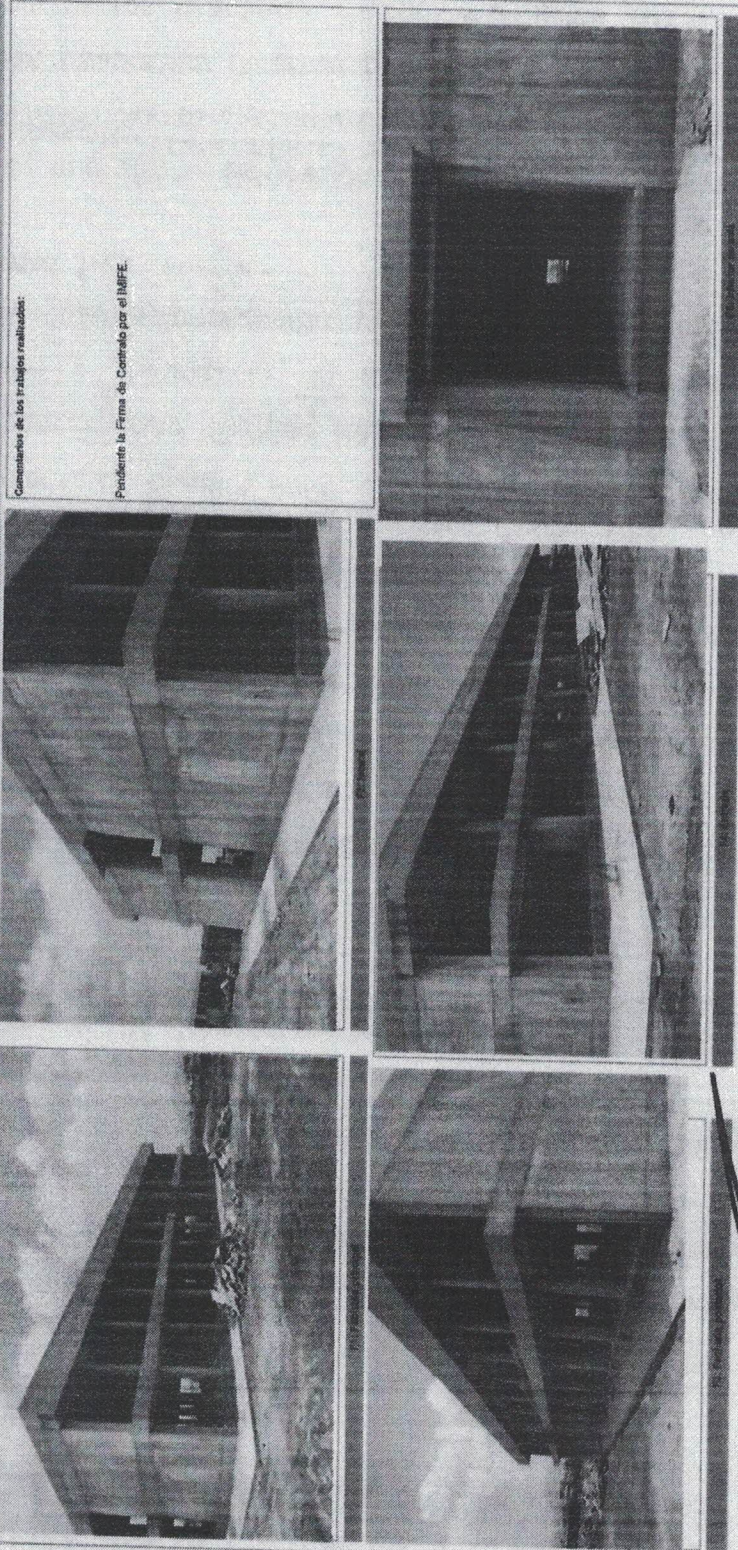

Comentarios de los trabajos realizados:

Pendiente la Firma de Control por el IMIFE.

ESTI A. JORGE ELEAZAR GARCIA MARTINEZ  
Nombre y firma del Titular de la SES

ESTI A. JORGE ELEAZAR GARCIA MARTINEZ  
Nombre y firma del Titular de la SES

\* Es muy importante que el avance fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se piden como bases planas, como sea necesario. Para equipamiento, instalaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
