



"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".

Rectoría

Ecatepec de Morelos, Estado de México,
a 8 de abril de 2022.

210C24010/257/2022

Doctor
Isaías Elizarrarás Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional


Estimado doctor:

Envío a usted el primer informe de avance trimestral (enero-marzo) de las obras apoyadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 en formato PDF y Excel, de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, con la finalidad de dar atención al correo electrónico del día 1 de abril del presente año, y al calendario establecido.

Agradezco de antemano su atención, a la vez que le envío un cordial saludo.



Atentamente
"Non nova, sed secus nova".

Maestro José Arturo Camacho Linares
Rector



C.C.P. C.P. Eder Josseman Castro Martínez, Secretario Administrativo
Mónica Zúñiga Salas jefa de Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Archivo/minutario
JACL/mzs

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Superior y Normal
Dirección General de Educación Superior
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

RESPONSABLES

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | | Monto autorizado | Monto ejercido | Remanente | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto | | | Acciones que sustentan el avance ² | Acciones por realizar | % de avance | Fichas ³ | | Observaciones | ¿Es susceptible de ser evaluado? (Cuales?) | Si ya fue inaugurada | | Cuenta con Actas | |
|-----------|--|----------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--|---------------|------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------|----------|---------------|---|----------------------|--|--|---|
| | | Obra de construcción | Equipamiento | Adecuaciones y mejoras | Mantenimiento | | | | Proyecto sustentable | Equipo/equipo | metros cuadrados | | | | metros cuadrados | Inicio | | | Término | Entrega y Recepción (Acta de Inauguración) | Acta de Recepción (Acta de Inauguración) | Monto de Acta de Recepción (Acta de Inauguración) |
| 1 | Adecuación y mejora de barda perimetral del conjunto universitario. | X | | | | \$ 1,848,474.00 | \$ - | \$ 1,848,474.00 | 756 | | | n/a | n/a | 0% | GLOBAL DEL PROYECTO | 01/04/22 | 30/12/22 | Se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México el oficio de autorización de los recursos para su liberación ante la Dirección General de Inversión del GEM. | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | Construcción de un edificio para un Centro de Investigación (obra nueva). | X | | | | \$ 2,674,996.00 | \$ - | \$ 2,674,996.00 | 1636 | | | n/a | n/a | 0% | GLOBAL DEL PROYECTO | 01/04/22 | 30/12/22 | Se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México el oficio de autorización de los recursos para su liberación ante la Dirección General de Inversión del GEM. | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Adquisición de una Subestación Eléctrica para la licitación de Gastronomía, talleres y laboratorios. | X | | | | \$ 1,800,000.00 | \$ - | \$ 1,800,000.00 | 1635 | | | n/a | n/a | 0% | GLOBAL DEL PROYECTO | 04/04/22 | 30/12/22 | Se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México el oficio de autorización de los recursos para su liberación ante la Dirección General de Inversión del GEM. | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | Impermeabilización y mantenimiento de los Edificios de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | X | | | | \$ 924,237.00 | \$ - | \$ 924,237.00 | 25817.00 | | | n/a | n/a | 0% | GLOBAL DEL PROYECTO | 01/04/22 | 30/12/22 | Se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México el oficio de autorización de los recursos para su liberación ante la Dirección General de Inversión del GEM. | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | Instalación de aires acondicionados | X | | | | \$ 610,601.00 | \$ - | \$ 610,601.00 | 25617 | | | n/a | n/a | 0% | GLOBAL DEL PROYECTO | 01/04/22 | 30/12/22 | Se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México el oficio de autorización de los recursos para su liberación ante la Dirección General de Inversión del GEM. | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | Instalación de infraestructura de datos | X | | | | \$ 2,000,000.00 | \$ - | \$ 2,000,000.00 | 0 | | | n/a | n/a | 0% | GLOBAL DEL PROYECTO | 01/04/22 | 30/12/22 | Se solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México el oficio de autorización de los recursos para su liberación ante la Dirección General de Inversión del GEM. | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | | | | | | \$9,457,905.00 | \$0.00 | \$9,457,905.00 | | | | | | | | | | | | | | |

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

MITRO JOSÉ ARTURO CAMACHO LLANES
Rector

MITRO JOSÉ ARTURO CAMACHO LLANES
Rector

MITRO JOSÉ ARTURO CAMACHO LLANES
Rector

MITRO JOSÉ ARTURO CAMACHO LLANES
Rector

MITRO JOSÉ ARTURO CAMACHO LLANES
Rector

MITRO JOSÉ ARTURO CAMACHO LLANES
Rector

MITRO JOSÉ ARTURO CAMACHO LLANES
Rector

MITRO JOSÉ ARTURO CAMACHO LLANES
Rector

1 Se capturaron los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anular parciales como sea necesario.
2 En esta sección se detallará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en los formatos dd, mm y aa.

Mes reportado
ABRIL 2022
FECHA DE CORTE:



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

2022
AÑO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO
Av. Central 5th, esquina Leona Vicario, código postal 55210, colonia Valle de Anáhuac Sección A, Ecatepec de Morelos Estado de México.

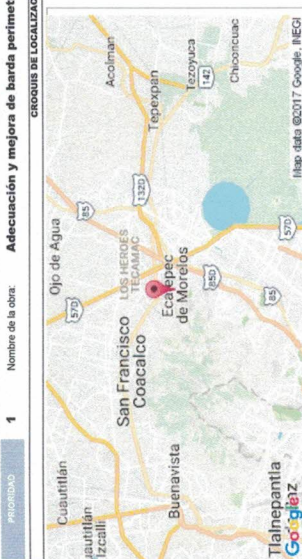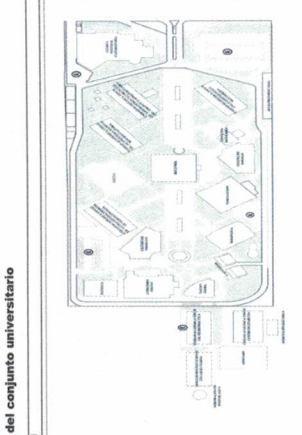


PROYECTO **1** Nombre de la obra: **Adecuación y mejora de banda perimetral del conjunto universitario**
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Porcentaje de avance
0%

Comentarios de los trabajos realizados:

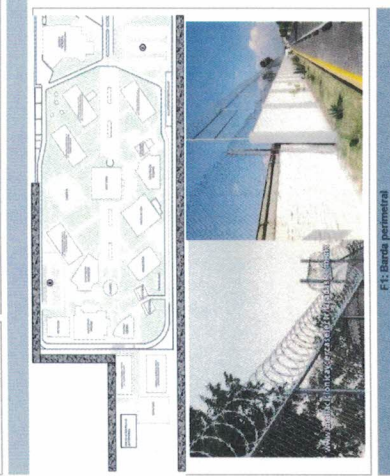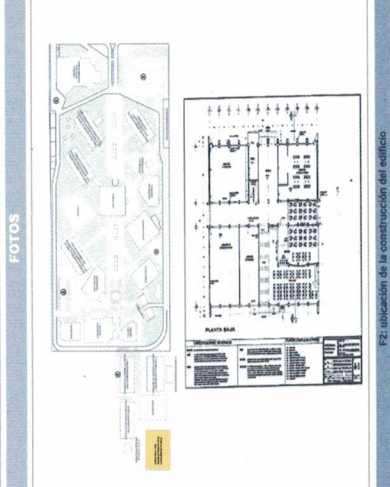

En espera del oficio por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

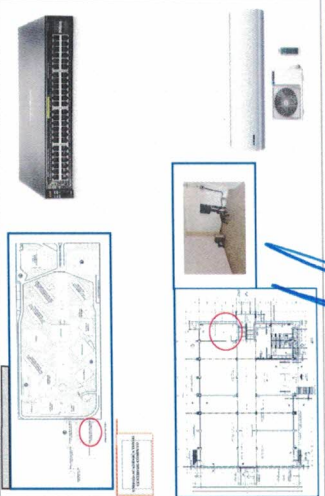

FF: ubicación de la red de datos y áreas acondicionadas

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
C.P. EDUARDO MORALES CORTIÑO MARRUTZ
Secretaría Administrativa

FF: ubicación de la impremeabilización

FF: ubicación de la subestación eléctrica
Nombre y firma del Titular de la IES
MTRA. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ LUMARES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
