



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



**EDOMÉX**  
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur".

**210C24010/811/2019**  
**Ecatepec, Estado de México,**  
**a 04 de Octubre de 2019**

**DOCTOR**  
**ISAÍAS ELIZARRARAS ALCARAZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO**  
**INSTITUCIONAL DE LA DGESU SEP.**  
**P R E S E N T E**

*Con el propósito de dar cumplimiento a los avances de obra, adjunto al presente el informe mensual correspondiente al mes de septiembre del presente año de la obra apoyada con Recursos Federales del Programa "Fondo de Aportaciones Múltiples" Nivel Superior; para el Ejercicio Fiscal y 2019 de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.*

*Mucho agradeceré sus comentarios al respecto, además de aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo.*

**A T E N T A M E N T E**  
**"Non nova, sed secus nova"**

  
**M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCÍA MARTÍNEZ**  
**RECTOR**



C.c.p. **Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.** - Directora General de Educación Superior Universitaria SEP.- Presente

Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Educación Superior y Normal  
Dirección General de Educación Superior  
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

Av. Central S/N Esq. Leona Vicario Col. Valle de Anáhuac Sección A  
Ecatepec de Morelos, Estado de México C.P. 55210 Tel.: 50 01 14 00  
www.uneve.edu.mx

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Estatal del Valle de Ecatepec**  
 Entidad Federativa: Estado de México  
 Clave Int 911: ISMSU09231

Nombre: **M EN G E ELIAS OMAR SALCEDO MARTINEZ**  
 Cargo: JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION  
 Telefono: 01 (55) 5001-1400 EXT. 101\_204  
 Correo electronico: uspp@ueve.edu.mx

Nombre: **M EN G E FIDEL NUCI HERRERA**  
 Cargo: SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
 Telefono: 01 (55) 5001-1400 EXT. 104\_126  
 Correo electronico: a.administracion@ueve.edu.mx

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	Cuenta con Actas		
		Otra de continuidad	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacio/equipo	cantidad			metros cuadrados	Inicio		Termino	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	¿Cuenta con todos los del evento?
1	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIÓN CON LABORATORIOS Y TALLERES CON EQUIPAMIENTO (OBRA NUEVA)	X				\$ 16,502,700.78	\$ 16,502,700.78		1	2,120		Solicitar al IMIFE el contrato de obra firmado para generar el cheque de anticipo a la Comisión de Inversión Pública el día 15/10/2019	0%	15/10/19	31/03/20	Con la Autorización de Pago AP-326957 se autoriza el pago del 100% de la obra antes de la Inversión del Gobierno del Estado de México. Por lo anterior se solicitó al IMIFE el contrato de obra firmado para generar el cheque de anticipo a la Comisión de Inversión Pública el día 15/10/2019			
	<b>TOTAL</b>					<b>\$ 16,502,700.78</b>	<b>\$ 16,502,700.78</b>		<b>1</b>	<b>2,120</b>									

M. EN A. JORGE ELEAZAR GARCIA MARTINEZ  
 Nombre y firma del Titular de la IES

M. EN G E FIDEL NUCI HERRERA  
 Nombre y firma del Titular de Cheque y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podran anasar tanta filas como sea necesario.  
 2 En esta seccion se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, menos que se vean reflejados en el reporte fotografico.  
 3 Es importante que las fechas de inicio y termino estan actualizadas. Toda en dos digitos, dia, mes y año.

2019

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Septiembre-2019

FECHA DE CORTE


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

1

Nombre de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES CON EQUIPAMIENTO (OBRA NUEVA)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

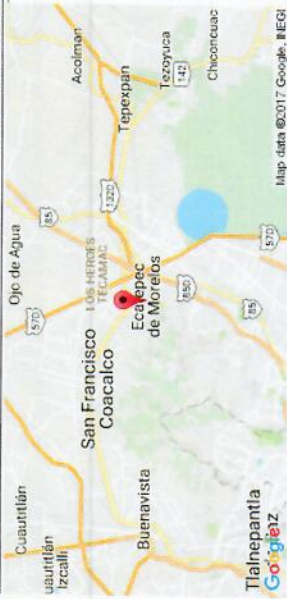


Porcentaje de avance

0%



Fecha Principal de la Entrada  
Estacion del Metro Ecatepec

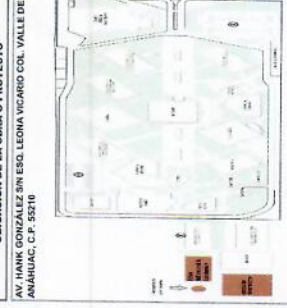

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  
AV. HANK GONZALEZ SIN ESQ. LEONA VICARIO COL. VALLE DE ANAHUAC, C.P. 55710

FOTOS



F1: Fachada posterior



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Con la Autorización de Pago AP-336687 la UNNE (hasta el 60% de los recursos destinados para esta obra, sede la Tesorería del Gobierno del Estado de México, en espera que el Instituto Mexicano de la Infraestructura y Fomento Educativo (IMIFE) envíe el Contrato de Obra firmado para otorgar el anticipo a la constructora e inició la obra.

M. ENA JORGE ELEAZAR GARCIA MARTINEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

F5: Interior de aula

M. M.G.E. FELIX NIÑO HERRERA

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postalita, se podrán copiar tantas postales como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Fecha y hora de consulta

19/06/2019 5:44:14 PM

Contrato

00563536

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL  
VALLE DE ECATEPEC

## Operación exitosa

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: REINTEGROS

Importe de la operación: 821.60 MXP

Cuenta de retiro: 0112183919

Cuenta de depósito: 0889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD ESTATAL DEL  
VALLE DE ECATEPE C FAM 2018Titular de la cuenta: 06 600 LINEA DE CAPT URA  
TESOF

Fecha de creación: 19/06/2019

Fecha de aplicación: 19/06/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856831190

Guía CIE: 3935800

Referencia: 0019ABED313750337462

Concepto: REINTEGROS

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057387022

Folio único: I382201906191744110057387027

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	19/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/06/2019



# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Concepto:** Reintegros 2018 (SIAFF)

**Importe:** \$ 821.60

**Número de operación:** 0001289285

**Efectuar por:** Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0019ABED313750337462</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 821.60</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>12/JUN/2019</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>12/JUL/2019</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Internet</b>



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
 BANAMEX  
 BANCOMER (CIE: 889466)  
 SCOTIABANK  
 AFIRME  
 BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
 HSBC (CLAVE RAP: 100)  
 BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
 BANREGIO  
 BANORTE (CEP: 62626)
